


I. DEMANDA DE ENERGÍA

Balance eléctrico por fuente 2019 - Acumulado a Febrero

Tipo de Fuente	GWh	%	Tipo de fuente	GWh	%
Termoeléctrica	40,14	2,31%	Hidroeléctrica	1 007,85	57,96%
			Geotérmica	233,56	13,43%
			Bagazo	37,79	2,17%
			Eólico	417,66	24,02%
			Solar	1,92	0,11%
No renovable	40,14	2,31%	Renovable	1 698,77	97,69%
Generación bruta: 1 738,91 GWh - ↓ -2,52%					
Intercambio de energía: 104,08 GWh					
Demanda Nacional: 1 842,99 GWh - ↑ 4,28%					

% Producción bruta de energía renovable

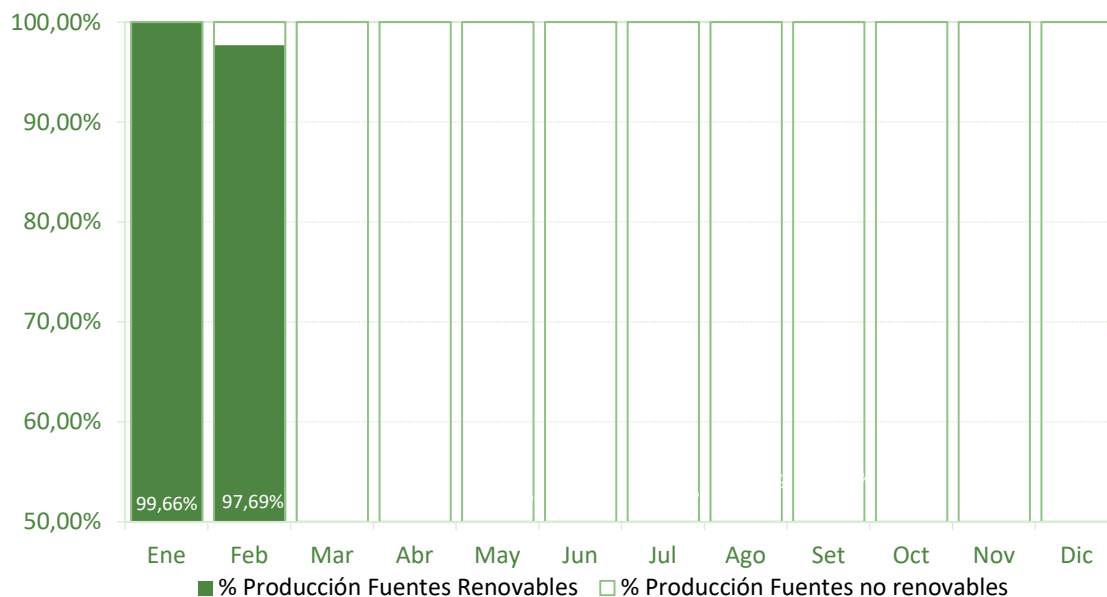


Comparación Demanda mensual de energía y Crecimiento 2018 - 2019


Demanda MWh

Mes	2018	% Crecimiento mensual	2019	% Crecimiento mensual	% Crecimiento anual
Ene	918 610,32	1,82%	953 467,63	3,38%	3,79%
Feb	848 705,03	-7,61%	889 524,03	-6,71%	4,81%
Mar	961 663,04	13,31%	-		
Abr	937 216,18	-2,54%	-		
May	972 384,18	3,75%	-		
Jun	925 982,34	-4,77%	-		
Jul	938 871,23	1,39%	-		
Ago	937 050,92	-0,19%	-		
Set	901 836,89	-3,76%	-		
Oct	923 393,26	2,39%	-		
Nov	926 708,06	0,36%	-		
Dic	922 279,76	-0,48%	-		
Acumulado	1 767 315,35		1 842 991,66	% crecimiento acumulado	4,28%

Demandas Máximas mensuales 2018-2019


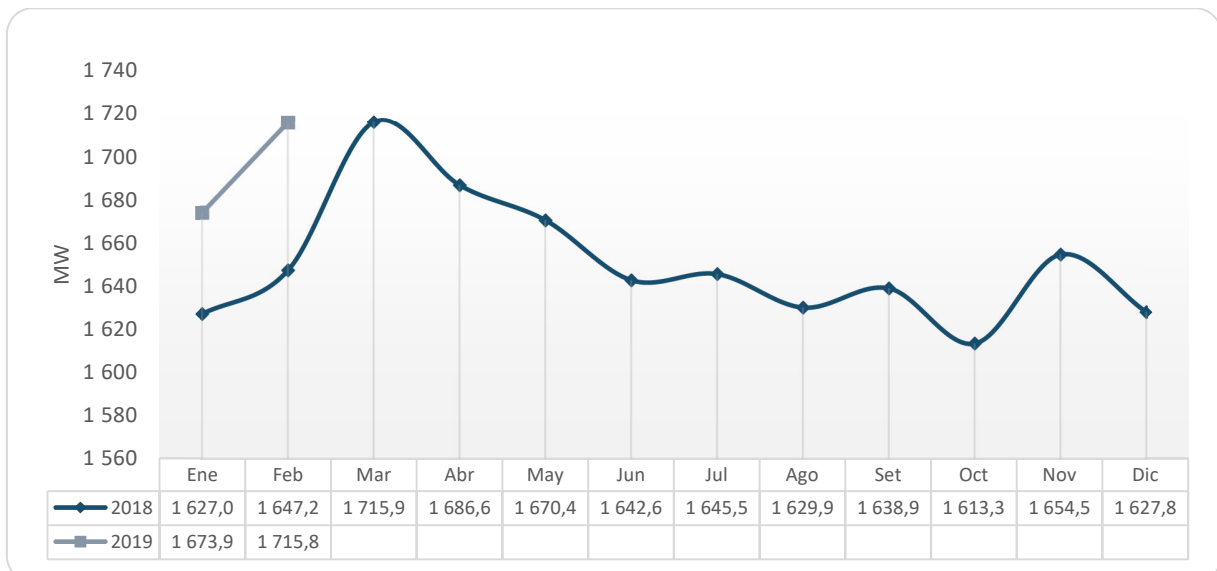


II. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

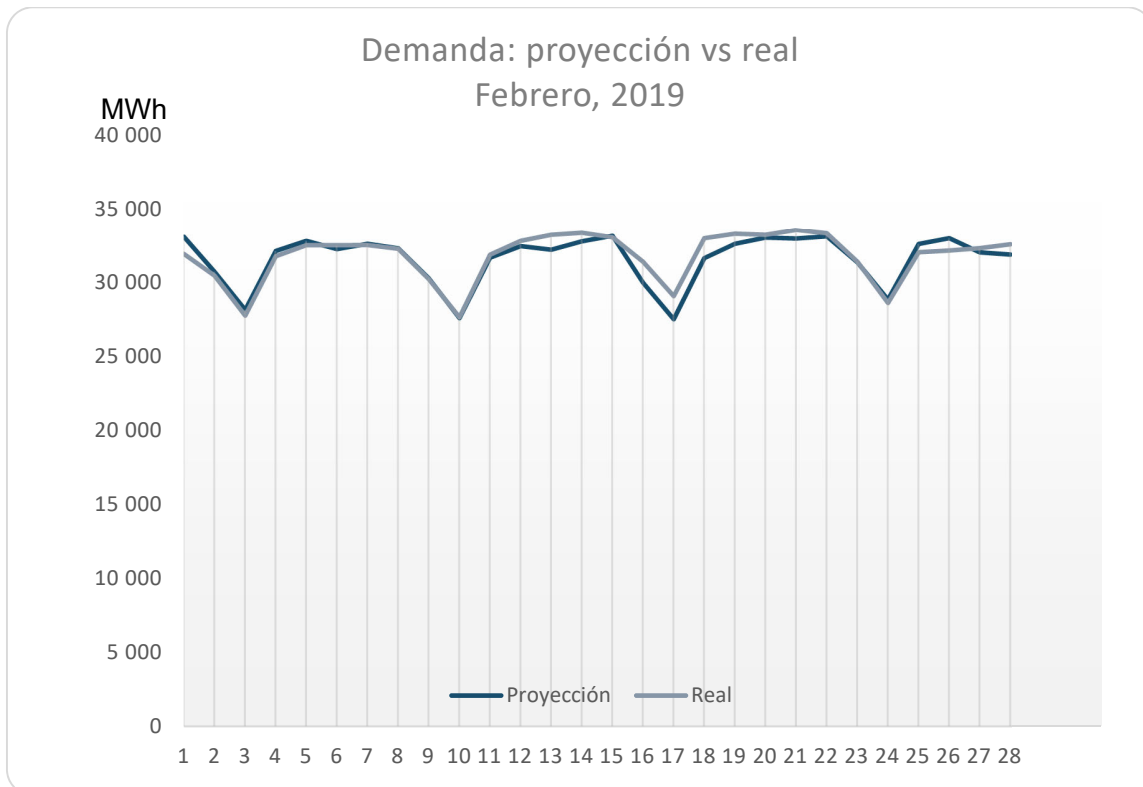


Producción bruta de Energía MWh				
Acumulado Febrero	2018	2019	Crecimiento	
Hidroeléctrico	1 272 328,8	1 007 853,6	-20,79%	↓
Termoeléctrico	526,3	40 138,9	7526,77%	↑
Geotérmico	74 921,0	233 556,8	211,74%	↑
Bagazo	35 862,1	37 785,1	5,36%	↑
Eólico	398 345,2	417 659,2	4,85%	↑
Solar	1 939,5	1 917,7	-1,12%	↓
Producción bruta	1 783 922,97	1 738 911,37	-2,52%	↓
Intercambio MWh	- 16 607,62	104 080,29		
Demanda MWh	1 767 315,35	1 842 991,66	4,28%	↑
Demanda Máxima MW	1 647,29	1 715,80	4,16%	↑


Producción bruta de energía 2018 -2019

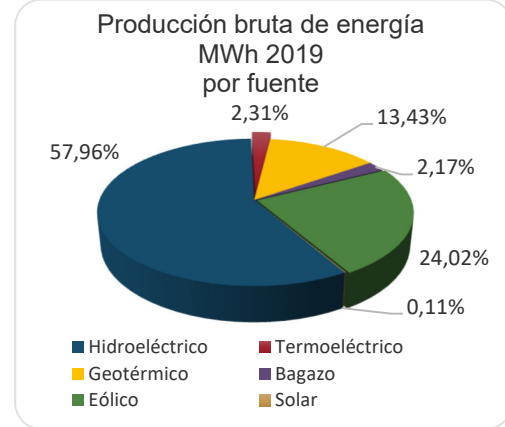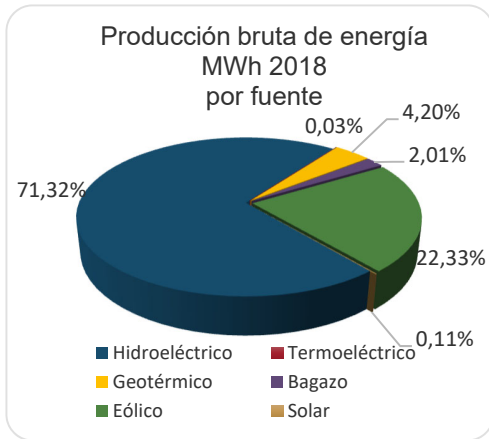

Producción bruta de energía termoeléctrica 2018-2019

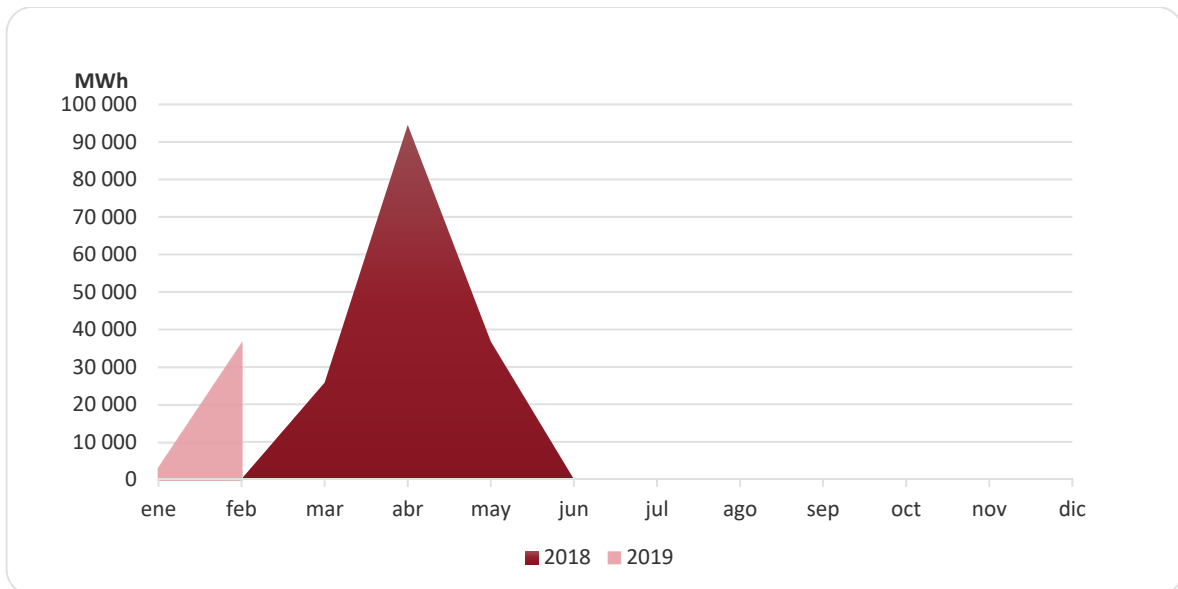



III. EMBALSE ARENAL

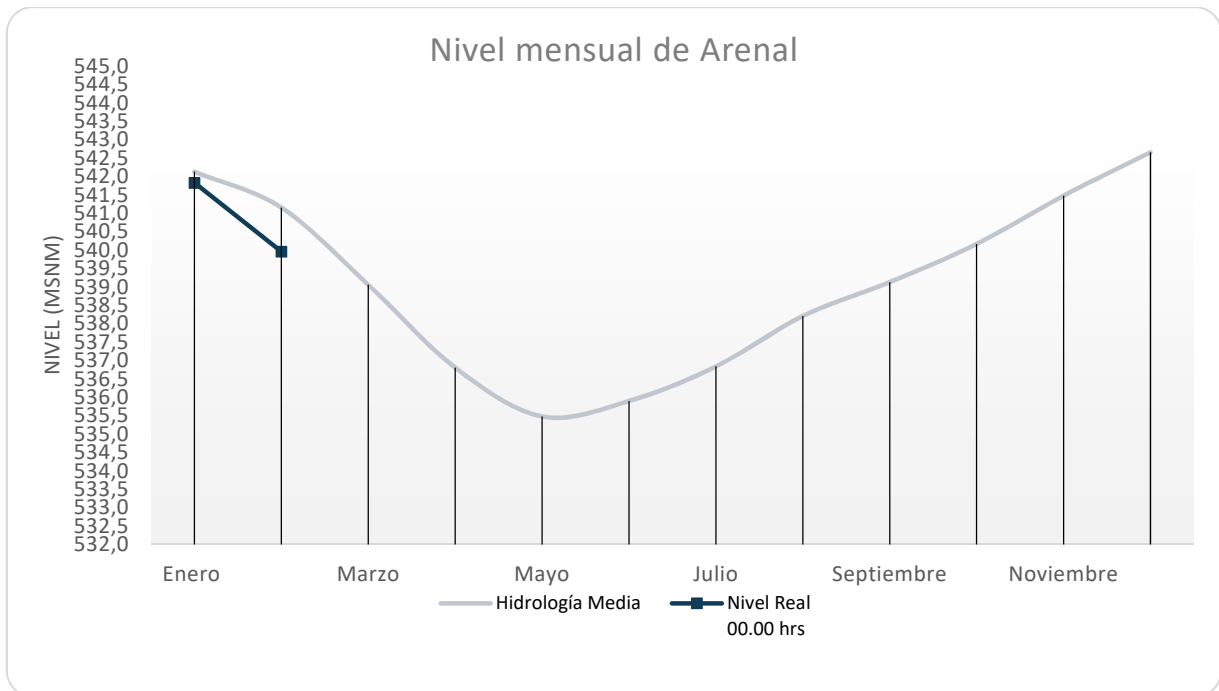


Curva Embalse Arenal 2019

Mes	Hidrología	Nivel Real
	Media	00.00 hrs
Nivel (m.s.n.m.)		
Enero	542,13	541,83
Febrero	541,16	539,96
Marzo	539,06	
Abril	536,81	
Mayo	535,48	
Junio	535,90	
Julio	536,84	
Agosto	538,21	
Septiembre	539,13	
Octubre	540,17	
Noviembre	541,48	
Diciembre	542,66	

IV. DEMANDA MÁXIMA

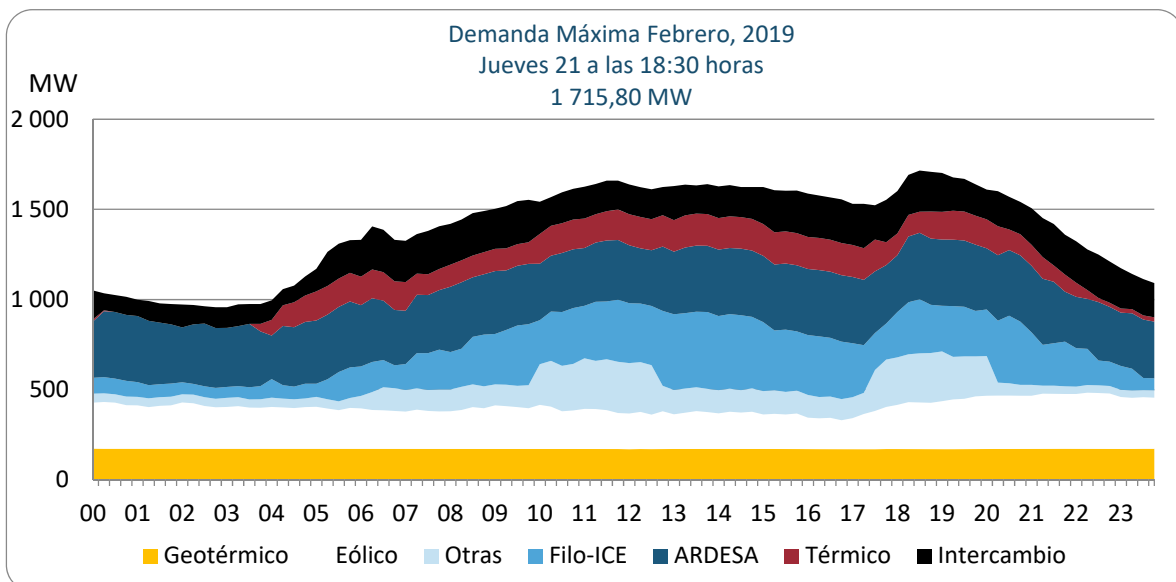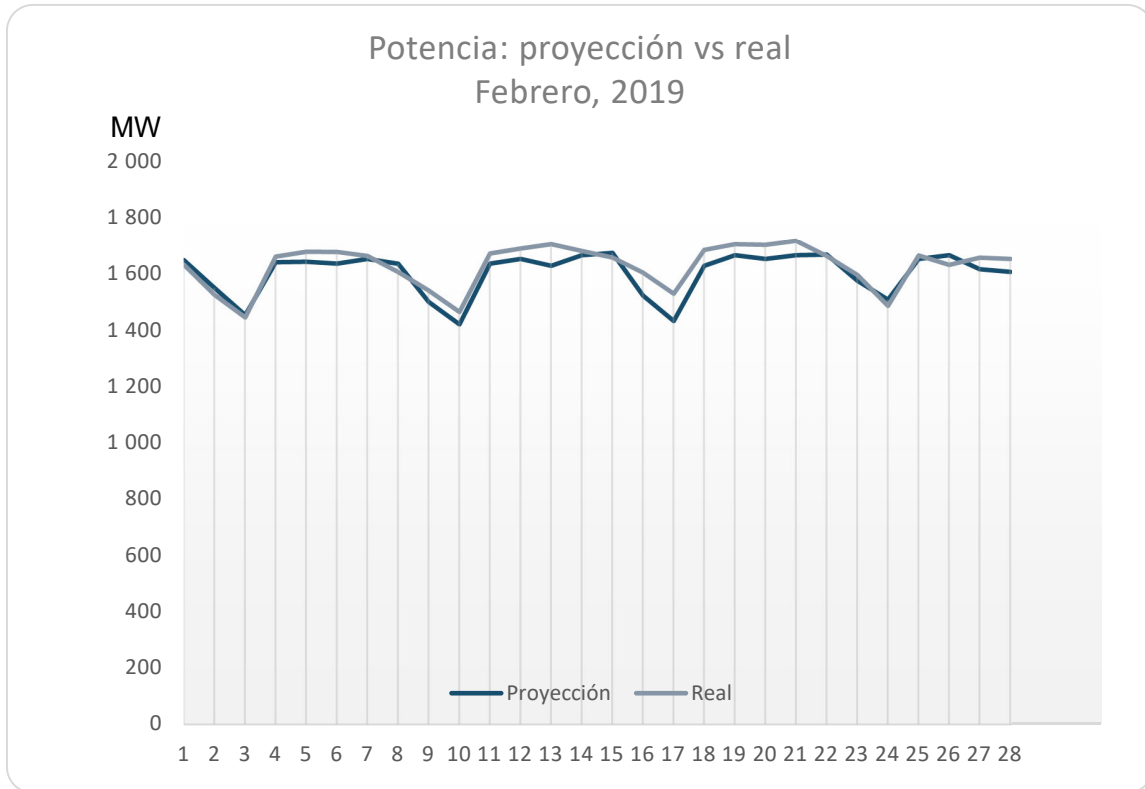

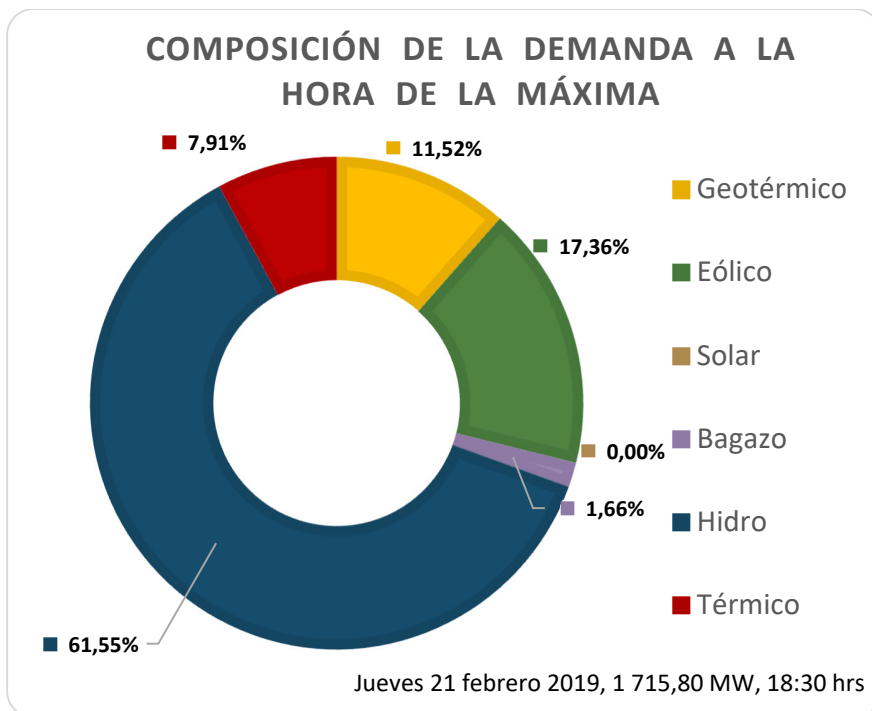

Sistema Eléctrico Nacional Capacidad Instalada en placa - Febrero, 2019


I.C.E. ⁷	Número Unidades	kW en placa ¹
ICE HIDRO		
Garita	4	134,740.00
Río Macho	5	135,680.00
Cachi	4	152,000.00
Arenal	3	157,398.75
Miguel Dengo	3	174,012.00
Sandillal	2	31,977.00
Angostura	3	172,201.50
Peñas Blancas	2	38,172.00
Cariblanco	2	87,941.00
Pirris	2	140,272.00
Toro I	2	27,300.00
Toro II	2	73,040.00
Toro III	2	47,520.00
Echandi	1	4,696.00
Reventazón	5	306,868.00
Subtotal Hidro	42	1,683,818.25
ICE TÉRMICO		
Moín Gas ⁴	4	156,450.00
Moín Gas - C.N.F.L. ⁵	2	90,000.00
Guápiles	2	14,267.20
Orotina	2	10,686.40
Garabito ⁶	11	202,708.00
Subtotal Térmico²	21	474,111.60
ICE GEOTÉRMICO		
Miravalles I	1	55,080.00
Miravalles II	1	55,080.00
Miravalles III	1	29,450.00
Miravalles V	1	10,500.30
Boca de Pozo I	1	4,999.70
Pailas	2	51,750.00
Subtotal Geotérmico	7	206,860.00
ICE EÓLICO		
Tejona ³	25	16,500.00
Subtotal Eólico	25	16,500.00
ICE SOLAR		
Parque Solar Miravalles	10	1,000.00
Subtotal Solar	10	1,000.00
TOTAL ICE (sin contratos)	105	2,382,289.85

OTRAS EMPRESAS ⁸	Número unidades	kW en placa
Hidro		
E.S.P.H.	6	52 900
J.A.S.E.C.	10	23 956
C.N.F.L.	22	126 337
Coopelesca	11	82 841
Coopeguanacaste	4	35 000
Conelétricas	5	46 780
Subtotal Hidro	58	367 814
Eólico		
Valle Central (CNFL)	17	15 300
COOPESANTOS	15	12 750
Río Naranjo (Coopegua)	3	9 000
P.E. Cacao (Coopegua)	9	21 150
Subtotal Eólico	44	58 200
Solar		
Juanilama	1	4 400
Subtotal Solar	1	4 400
Total Otras Empresas	103	430 414

Generación Ley 7200 Capítulo I ⁹	Número unidades	kW en placa	En contrato
HIDRO			
Tapezco	1	208	186
El Ángel	2	3 424	3 850
El Ángel Ampliación	2	5 568	5 000
Caño Grande	13	2 917	2 570
Platanar	2	14 594	15 000
Suerkata	1	3 000	2 700
Don Pedro	1	14 000	14 000
Poás I y II	3	2 125	1 942
Matamoros	7	4 790	4 828
Río Lajas	2	11 000	10 000
El Embalse	2	2 000	1 500
Volcán	1	17 000	17 000
Río Segundo II	3	1 074	1 030
Doña Julia	2	18 000	17 400
Caño Grande III	1	3 375	3 280
Santa Rufina	1	336	290
Vara Blanca	1	2 677	2 500
Rebeca I	1	85	85
Subtotal Hidro	46	106 174	103 161
EÓLICO			
Plantas Eólicas	55	22 660	19 800
Aeroenergía	9	6 750	6 400
Tilawind	7	21 000	19 550
Movasa	32	20 000	20 000
Vientos del Este	4	12 000	9 000
Mogote	7	21 000	20 000
Altamira	10	20 000	20 000
Campos Azules	10	20 000	20 000
Vientos de Miramar	10	20 000	20 000
Vientos de La Perla	10	20 000	20 000
Subtotal Eólico	154	183 410	174 750
BAGAZO			
El Viejo	1	32 500	18 000
Taboga	3	20 000	19 800
Subtotal Bagazo	4	52 500	37 800
Total Ley 7200, Capítulo I	204	342 084	315 711

Generación Ley 7200, Capítulo II ⁹	Número unidades	kW en Placa	kW Contrato
Hidro			
El General	2	42 000	39 000
La Joya	3	50 700	50 000
Torito	2	67 500	50 000
Chucús	2	51 600	50 000
Subtotal Hidro	9	211 800	189 000
Eólico			
P.E. Guanacaste	55	49 500	49 500
Chiripa	33	49 500	49 500
Orosí	25	50 000	50 000
Subtotal Eólico	113	149 000	149 000
Total Ley 7200, Capítulo II	122	360 800	338 000

Sistema Eléctrico Nacional Instalado en Placa			
ICE	kW	Unidades	%
Hidro	1 683 818	42	70.68%
Térmico	474 112	21	19.90%
Geotérmico	206 860	7	8.68%
Eólico	16 500	25	0.69%
Solar	1 000	10	0.04%
Total ICE	2 382 290	105	67.76%
Otras Empresas			
Hidro	367 814	58	85.46%
Biogás			
Eólico	58 200	44	13.52%
Solar	4 400	1	1.02%
Total Ot. Empresas	430 414	103	12.24%
Ley 7200, Capítulo I			
Hidro	106 174	46	31.04%
Eólico	183 410	154	53.62%
Biomasa	52 500	4	15.35%
Total Ley 7200, Capítulo I	342 084	204	9.73%
Ley 7200, Capítulo II			
Hidro	211 800	9	58.70%
Eólico	149 000	113	41.30%
Total Ley 7200, Capítulo II	360 800	122	10.26%
Total instalado	3 515 588	534	

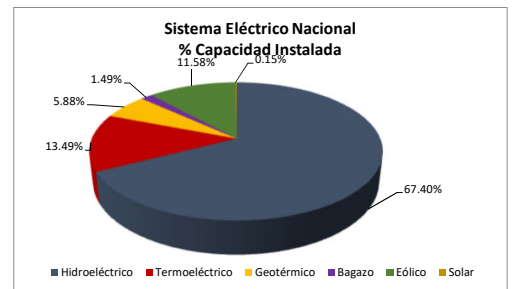

Resumen kW Costa Rica			
Hidroeléctrico	2 369 606		67.40%
Termoelectrico	474 112		13.49%
Geotermico	206 860		5.88%
Bagazo	52 500		1.49%
Eólico	407 110		11.58%
Solar	5 400		0.15%
Total	3 515 588		100.00%

Consideraciones:

- Placa Generador** = Dato de diseño del generador utilizado en la unidad, no necesariamente corresponde con la potencia del conjunto turbina-generador.
- Mínima de operación** = mínimo para operación estable y segura de la unidad.
- Las plantas de San Antonio y Barranca salen de operación a partir del 01/01/2019.
- La planta eólica Tejona ajusta la potencia por la salida de una unidad.
- En la unidad # 8 Moín G. el generador es de 48 150 KW, mientras que la turbina es de 34 651 KW.
- En la unidades # 9 y 10 de Moín CNFL los generadores son de 45 000 KW, mientras que las turbinas son de 39 300 KW.
- Para el caso de Garabito se debe planificar con solo 10 unidades ya que la onceava unidad es un respaldo de potencia.
- Datos suministrados por el Negocio de Generación del ICE.
- Potencia en placa sin confirmar. En periodo de revisión.
- De acuerdo a los contratos vigentes. Se sustituyen los nombre *Generación Privada* y *Grupo BOT* según la Ley 7200. En periodo de revisión.
